

《雪线之外》网页游戏项目计划书

一、项目是什么

《雪线之外》是一款运行在浏览器中的冰雪题材生存探索游戏。玩家扮演在极端寒冷环境中求生的角色，沿地图探索废弃观测站、临时营地等地点，通过与 NPC 对话、调查场景和使用卡牌获取物资与故事碎片，逐步拼凑出完整剧情。

1.1 项目目标

1. 建立一个网页游戏原型。
2. 用冰雪像素画面和二次元剧情对话形成视觉叙事。
3. 验证地图探索、碎片化叙事、生存资源和基础卡牌机制。

1.2 交付物

交付物	内容	验收形式
可运行网页原型	登录页、主菜单/人物页、剧情页、地图页、事件或卡牌页	浏览器打开并完成主流程
地图与素材	冰雪地图、角色/场景图、卡牌背景、按钮与图标	页面正确加载，无明显错位
剧情与规则	主线、三个触发点、NPC 对话、基础卡牌/资源规则	文档与页面内容一致
项目文档	README、项目计划、项目日志、使用说明	GitHub 仓库可查阅
展示材料	小组介绍/宣传视频、演示流程	可在汇报时播放或现场演示

二、项目来源与背景

项目源于课程前期小组讨论。第一次会议围绕地图、剧情节点、卡牌玩法、网页原型规范和 Git 协作展开，已经确定了冰雪像素风、碎片化叙事和网页技术路线。仓库中已有登录页面、地图页面、贴图资源以及剧情文档，说明项目已经从想法进入原型实现阶段。

三、具体内容与功能结构


3.1 网站/游戏内容树状图

《雪线之外》网页游戏

└─ 登录与入口



3.2 核心用户流程



3.3 功能细节

登录与注册 用户输入账号和密码后进入主界面。本阶段采用前端原型验证，数据可使用浏览器本地存储或演示用状态，不承诺真实账号系统。输入为空、格式错误时给出明确提示。

地图探索 地图以冰雪像素场景为主体，地点采用可点击区域或按钮标识。点击地点后进入对应事件，返回时保留当前探索状态。地图代码与资源路径分离，方便后续替换贴图。

剧情对话 对话框显示角色名、头像、正文和继续按钮；对话结束后进入调查或地点选择。NPC 对话承担世界观说明和线索提示。

碎片化叙事 每个剧情触发点至少提供一段 NPC 对话、一个可调查对象和一个可记录的故事碎片。碎片列表用于展示玩家已获得内容，最终把三个地点的信息串联起来。

基础卡牌与资源 先实现少量、规则清晰的卡牌，不在原型阶段扩张复杂牌组。卡牌可影响食物、子弹、火堆或故事线索；每次使用后在界面上显示结果，便于用户理解。具体数值由岑安乾，刘书宏在第二周前半段确定。

四、技术方案

项目	方案
开发环境	Windows，Visual Studio Code
代码托管	GitHub 仓库 anqiancen/pre-semester-project
前端结构	HTML5 页面、CSS3 外部样式表、原生 JavaScript

项目	方案
数据方式	原型阶段使用 JavaScript 内存状态或 localStorage
发布方式	GitHub 仓库直接预览，或使用静态网页服务器托管
图像资源	PNG 等位图素材；地图贴图、角色图和界面图统一管理

五、角色分工

成员	主责	具体工作	交付节点
陈子琪	地图、美术资源、项目统筹	生成地图代码、整理冰雪贴图、提供角色/界面素材、设计卡牌界面、维护 README 和项目计划、协助统筹合并	第 1 周地图基础版；第 2 周素材和卡牌；第 3 周整合
岑安乾	登录与注册页面	完成登录/注册页面、输入校验、入口跳转、与主流程联调	第 1 周末完成入口
戢歆雅	剧情与宣传	剧情文本、NPC 对话、剧情节点、宣传视频剪辑与展示材料	第 1 周剧情框架；第 2 周节点内容；第 3 周视频定稿
陈曦然	剧情与关卡	与季新雅共同设计主线、三个触发点、调查内容和碎片化叙事逻辑	第 2 周前半段完成关卡稿
刘书宏	卡牌规则与测试	与陈子琪组织确定卡牌规则、物资消耗和事件反馈，参与可玩性测试	第 2 周前半段规则定稿

六、完整三周时间表

第 1 周：需求冻结与基础原型

工作内容	里程碑/验收
确认项目范围、页面清单、分工和 Git 提交规则；整理剧情主线、三个触发点和卡牌机制草案；完成登录页、地图原型、素材目录和基础对话；完成 README 初稿并进行首次联调。	登录入口、地图页面和剧情骨架可以打开并演示；第一版需求范围冻结。

第 2 周：功能实现与内容填充

工作内容	里程碑/验收
确定卡牌类型、资源数值和反馈规则；完成三个剧情触发点的 NPC 对话、调查对象和故事碎片；加入地点切换、事件状态、卡牌反馈、人物卡牌和诗词栏；完成全员体验测试。	至少 3 种卡牌可操作；三个剧情节点内容完整；主流程无明显断点；形成问题清单。

第 3 周：整合、质量控制与展示

工作内容	里程碑/验收
修复高优先级问题；统一字体、颜色、按钮、对话框和地图布局；进行桌面端、移动端和浏览器兼容性检查；补齐 README、项目计划和截图；完成宣传视频、演示路线、最终回归测试和仓库提交。	核心流程可连续完成；视觉风格统一；验收清单完成；项目可从干净环境重新打开并演示。

七、进度与质量控制

7.1 进度

- 采用git：完成的代码和素材及时提交 GitHub。
- 每项任务必须有负责人、截止日和可验证结果
- 登录入口、地图主流程、剧情触发和卡牌反馈属于高优先级，装饰性内容在主流程稳定后再做。
- 第 1 周末冻结页面范围，第 2 周末冻结主要功能，第 3 周只做修复、统一和展示准备，避免临近提交时大幅改需求。

7.2 质量

检查类别	必检内容	通过标准
功能	登录、跳转、对话继续、地点触发、卡牌点击、返回	主流程连续完成，无死链
内容	人物名、地点名、剧情顺序和卡牌说明	无明显错别字，内容与设计稿一致
视觉	图片比例、文字可读性、按钮状态、地图布局	不遮挡、不溢出、风格统一
技术	Console 报错、资源 404、文件路径、重复代码	Console 无阻断性错误，资源全部加载
兼容	Chrome/Edge、桌面宽度、移动宽度	关键功能均可使用
协作	提交记录、文件命名、README、版本备份	新成员按文档可运行项目

八、示例图与原型说明

仓库已有素材可作为计划书中的示例：`map ver 0.1/map1.html` 与 `map2.html` 展示地图原型，`winter_town.png`、`winter_beach.png` 和 `winter_outdoorsTileSheet.png` 可用于说明冰雪

地图风格， [login/index.html](#) 可用于说明登录入口。最终 Word/PDF 版本会将这些页面/素材截图或示意图放入附录

8.1 页面线框示意

现有原型素材示例：












8.2 卡牌交互示意

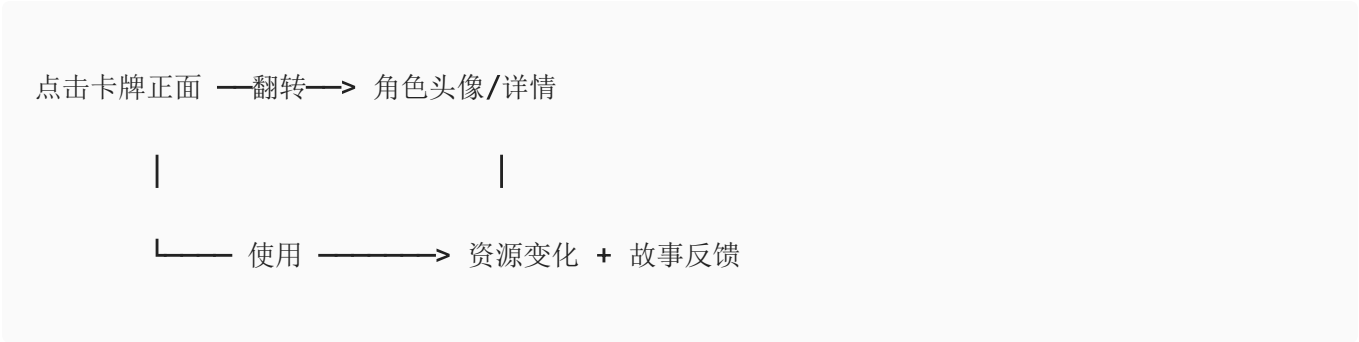

九、风险与应对

风险	影响	应对措施
卡牌规则迟迟不能确定	阻塞开发	第 2 周前只保留 3 种基础卡牌，先实现接口和反馈
素材风格不一致或缺失	页面观感下降	第 1 周建立素材目录和尺寸规范，优先使用已有冰雪素材
成员时间冲突	任务延期	每项任务设置可交接文件；高优先级任务至少让一名成员了解状态
页面互相跳转失败	主流程中断	每次合并后执行入口到结尾的冒烟测试
外部资源无法加载	演示失败	关键图片放入仓库本地路径，避免依赖不稳定外链
需求不断增加	三周无法收尾	第 1 周冻结范围，新增需求排到第 3 周之后

十、预期成果与验收结论

三周结束时，项目应当能够在浏览器中从登录入口开始，依次完成剧情序章、进入冰雪地图、选择至少三个剧情地点、触发 NPC 对话、获得故事碎片、使用基础卡牌并查看人物/诗词内容。页面应有统一的冰雪主题，代码和素材结构清楚，仓库中保留项目计划、README、会议记录和可运行原型。
